

Preuve de travail Gestion de projet

PBS & OBS - Activité 1.5

3.1 PBS (Product Breakdown Structure) - Qu'est-ce qu'on livre ?

Niveau 1 : Le Système	Niveau 2 : Grands Blocs (Conteneurs)	Composants principaux (Boîtes noires)	Réf. CDC (Sections / Pages)
Outil Collaboratif MJC	1. Vitrine Publique	Catalogue d'activités, Agenda public, Système d'articles/news, Module emploi/bénévolat.	Section 4.1 (p. 8-11)
	2. Intranet Privé	Annuaire (Équipes/Intervenants), Gestionnaire de matériel, Espace Projets, Flux "Bons plans".	Section 4.2 (p. 12-14)
	3. Socle de Données	Base de données unifiée, Script de migration des données historiques.	Section 4.3 & 6.2 (p. 15, 18)
	4. Infrastructure	Environnement d'hébergement, Nom de domaine, Certificats de sécurité (SSL).	Section 6.3 & 5.1 (p. 19, 17)
	5. Kit d'Accompagnement	Documentation utilisateur, Supports de formation (Admin/User), Guide d'administration technique.	Section 6.4 (p. 19)

Le produit final est décomposé en 5 blocs de résultats tangibles :

- Vitrine Publique Web** : Site responsive regroupant la présentation du réseau, le catalogue d'activités filtrable, l'agenda mutualisé et le module emploi/bénévolat.
- Espace Intranet Collaboratif** : Plateforme sécurisée incluant les annuaires (intervenants/équipes), la gestion de matériel partagé, l'espace projet et le forum "Bons plans".
- Socle de Données Centralisé** : Base de données SQL structurée selon le modèle du CDC et scripts de migration des données historiques des 9 MJC.
- Infrastructure Technique** : Serveur d'hébergement configuré, nom de domaine et environnement de test/production.
- Pack Accompagnement** : Documentation complète (guides utilisateurs et administrateur) et rapports de sessions de formation.

3.2 OBS (Organisation Breakdown Structure) - Qui fait quoi ?

Acteur	Rôle dans le projet	Niveau de décision	Intérêts principaux	Réf. CDC (Sections / Pages)
CA des 9 MJC	Maître d'ouvrage (Financeurs)	Stratégique (Validation budget)	Rentabilité, image de marque, respect des coûts.	Section 2 (p. 6)
Collectif MJC Grésivaudan	Product Owners (Référents métier)	Opérationnel (Validation fonctionnelle)	Mutualisation des ressources, cohérence du réseau.	Section 2 (p. 6)
Équipes MJC (Pro)	Utilisateurs experts / Administrateurs	Consultatif	Gain de temps, simplicité de saisie, fiabilité des données.	Section 2 & 4.2 (p. 6, 12)
Équipes MJC (Bénévoles)	Utilisateurs / Contributeurs	Consultatif	Facilité d'utilisation (faible barrière technique).	Section 1.1 (p. 5)
Adhérents & Public	Utilisateurs finaux (Consommateurs)	Nul	Accès rapide à l'info, ergonomie mobile, clarté.	Section 2 & 4.1 (p. 6, 8)
Prestataire Technique	Maître d'œuvre (Réalisation)	Technique	Respect des délais, stabilité de l'outil, maintenabilité.	Section 6 (p. 18-19)

3. Vérification Croisée

Pour vérifier que chaque produit a un responsable et que chaque acteur a une utilité.

- **Vitrine Publique** ↔ **Grand Public** (Consomme) & **Équipes** (Alimentent).
- **Intranet Privé** ↔ **Équipes** (Utilisent) & **Collectif** (Collabore).
- **Base de Données** ↔ **Prestataire** (Structure) & **CA** (Propriétaire légal).
- **Infrastructure** ↔ **CA** (Paye) & **Prestataire** (Configure).
- **Kit Accompagnement** ↔ **Prestataire** (Produit) & **Équipes** (Apprennent).
- Chaque bloc du **PBS** est rattaché : la **Vitrine** pour le Public, l'**Intranet** pour les Équipes, la **Base de données** pour le Prestataire (conception) et le Collectif (propriété).
- Chaque acteur de l'**OBS** a un livrable cible : le **CA** reçoit l'Infrastructure et la Maintenance, les **Équipes** reçoivent la Formation et l'Intranet.

WBS — Work Breakdown Structure : Outil Collaboratif MJC

Ce document décompose les grands blocs du PBS en lots de travail (composants livrables).
Chaque élément est un **résultat**, pas une action.

1. Bloc Vitrine Publique (Front-end)

(PBS Réf. CDC : Section 4.1, p. 8-11)

Responsable OBS : Prestataire Technique / Validation : Collectif MJC (Réf. Section 2, p. 6)

- **1.1 Architecture de navigation** : Plan du site validé et arborescence des menus.
- **1.2 Module "Recherche d'Activités"** : Interface de filtrage (par MJC, âge, thématique) et fiches descriptives (Réf. 4.1.3, p. 10).
- **1.3 Agenda Communautaire** : Vues Calendrier et Post-it synchronisées avec la base de données (Réf. 4.1.4, p. 10).
- **1.4 Système d'Actualités** : Flux de news et gestionnaire de catégories d'articles (Réf. 4.1.5, p. 11).
- **1.5 Module Emploi/Bénévolat** : Interface de dépôt et de consultation des annonces (Réf. 4.1.6, p. 11).
- **1.6 Composants UI/UX** : Maquettes graphiques, kit de composants (boutons, formulaires) et charte visuelle (Réf. 5.4, p. 18).

2. Bloc Intranet Collaboratif (Espace Privé)

(PBS Réf. CDC : Section 4.2, p. 12-14)

Responsable OBS : Prestataire Technique / Utilisateurs : Équipes MJC (Réf. Section 2, p. 6)

- **2.1 Système d'Authentification** : Gestion des accès sécurisés par rôle (Administrateur vs Utilisateur) (Réf. 2, p. 6).
- **2.2 Annuaire Interactif** : Bases de données consultables des intervenants et des équipes (Réf. 4.2.2, p. 12).
- **2.3 Module Gestion de Matériel** : Interface de prêt, état des stocks et localisation du matériel (Réf. 4.2.3, p. 12).
- **2.4 Espace de Travail "Projets"** : Système de partage de documents et espace de dialogue (chat projet) (Réf. 4.2.4, p. 13).
- **2.5 Module "Bons Plans"** : Système de publication temporaire avec gestion de date d'expiration (Réf. 4.2.5, p. 13).

3. Bloc Socle de Données (Core & Backend)

(PBS Réf. CDC : Section 4.3, p. 15)

Responsable OBS : Prestataire Technique

- **3.1 Modèle de Données Unifié** : Schéma SQL finalisé incluant toutes les entités du CDC (Réf. 4.3, p. 15).
- **3.2 API de Gestion de Contenu** : Endpoints de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD) (Réf. 4.4, p. 16).
- **3.3 Kit de Migration** : Scripts d'importation automatisés pour les fichiers existants (Excel, CSV) (Réf. 6.2, p. 18).
- **3.4 Système d'Alertes** : Module d'envoi de notifications par email lors d'ajouts de contenus (Réf. 4.2.7, p. 14).

4. Bloc Infrastructure & Déploiement

(PBS Réf. CDC : Section 6.3, p. 19)

Responsable OBS : Prestataire Technique / Financeur : CA des MJC (Réf. Section 2, p. 6)

- **4.1 Environnement de Production** : Serveur configuré avec sauvegardes automatiques (Réf. 6.3, p. 19).
- **4.2 Sécurité & Accès** : Certificat SSL (HTTPS) et configuration du nom de domaine (Réf. 5.1, p. 17).
- **4.3 Indexation & SEO** : Configuration du sitemap et des balises méta pour le référencement (Réf. 5.5, p. 18).
- **4.4 Solution d'Hébergement** : Plateforme d'hébergement opérationnelle et conforme aux besoins de stockage (Réf. 6.3, p. 19).

5. Bloc Accompagnement & Livraison

(PBS Réf. CDC : Section 6.4, p. 19)

Responsable OBS : Prestataire Technique / Bénéficiaires : Équipes MJC (Réf. Section 6.4, p. 19)

- **5.1 Guide de l'Administrateur** : Documentation technique pour la gestion du système.
- **5.2 Manuel de l'Utilisateur** : Guide pratique illustré pour les salariés et bénévoles.
- **5.3 Support de Formation** : Présentations et exercices pour les sessions de prise en main.
- **5.4 Environnement de Démo** : Instance de test (Sandbox) pré-remplie avec des données fictives (Réf. 6.1, p. 18).

Note de Cadrage & WBS : Outil Collaboratif MJC

1. Note de Cadrage (Référentiel Manager-go)

1.1 Définition du projet (Quoi)

Le projet consiste en la conception et le déploiement d'une plateforme numérique hybride comprenant une **vitrine web publique** pour les usagers et un **intranet collaboratif** pour les équipes des 9 MJC du Grésivaudan. L'idée est d'unifier la communication tout en respectant l'autonomie de chaque structure. (Réf. Section 1, p. 5)

1.2 Origine du projet / Contexte (Pourquoi)

- **Genèse** : Suite à la dissolution de la fédération régionale des MJC, le collectif local souhaite reprendre en main sa communication et ses outils de gestion. (Réf. Section 1.1, p. 5)
- **Problème à résoudre** : Actuellement, les outils sont disparates (certaines MJC n'ont pas de site) et les données sont stockées dans des formats hétérogènes, ce qui empêche toute mutualisation efficace du matériel ou des compétences. (Réf. Section 1.2, p. 5)

1.3 Objectifs du projet

- **Quantitatifs** : Unifier les données des 9 structures d'ici la rentrée 2018 ; migrer 100% des annuaires et inventaires matériels. (Réf. Section 3.1, p. 7)
- **Qualitatifs** : Améliorer la visibilité du réseau auprès du public et des partenaires ; simplifier le travail quotidien des équipes via un accès unique aux ressources. (Réf. Section 3.2 & 3.3, p. 7)
- **Indicateur de succès** : Adoption de l'outil par les 9 structures et remplacement effectif des anciens sites internet. (Réf. Section 6.4, p. 19)

1.4 Périmètre du projet

- **Inclus (IN)** : Développement complet, base de données centralisée, module de migration, hébergement, formation des référents et SEO. (Réf. Section 4 & 6, p. 8-19)
- **Exclu (OUT)** : Gestion éditoriale quotidienne, achat de matériel physique, animation de réseaux sociaux externes. (Réf. Section 6.4, p. 19)

1.5 Acteurs (Qui)

- **Commanditaire** : Conseils d'Administration des 9 MJC (Pouvoir de décision budgétaire).
- **Chef de projet MOA** : Collectif MJC Grésivaudan (Validation fonctionnelle).
- **Utilisateurs clés** : Équipes des MJC (Salariés et bénévoles).
- **Maître d'œuvre (MOE)** : Prestataire technique.

1.6 Macro-Planning (Quand)

- **Lancement** : Fin 2017 / Début 2018.
- **Jalon test** : Printemps 2018 (Versions de test toutes les 2 semaines).
- **Livraison finale** : Été 2018.
- **Mise en service** : Rentrée scolaire 2018.

1.7 Ressources (Comment)

- **Humaines** : Équipe prestataire, 1 super-administrateur client, groupe de formation (5-10 pers).
- **Matérielles** : Solution d'hébergement performante, base de données SQL.
- **Financières** : Enveloppe globale validée par les CA des 9 MJC (incluant maintenance et formation).

1.8 Communication

Réunions de démonstration de l'avancement toutes les deux semaines. Support utilisateur et documentation technique fournis à la livraison.

1.9 Risques

- **Technique** : Complexité de la migration due à la diversité des formats sources.
- **Organisationnel** : Résistance au changement ou manque de disponibilité des bénévoles pour la formation.
- **Budgétaire** : Sous-estimation du temps de nettoyage des données initiales.

2.4 — Matrice RACI


Matrice des Livrables Critiques

Livrables (par rapport WBS)	Prestataire	Collectif MJC	CA des 9 MJC	Équipes MJC (Users)	Public / Adhérents
1.6 Maquettes UI/UX & Charte	R	A	I	C	I - C
3.1 Modèle de Données Unifié	R	A	I	C	I
3.3 Migration des données	R	A	I	C	-
4.4 Solution d'Hébergement	R	C	A	I	-
5.3 Supports de Formation	R	A	I	C	-

2.5 — Dépendances et chemin critique

1. Diagramme de dépendances (Logique FD)

Voici la structure logique du projet :



Note : Le lot E dépend de C et D. Comme D dépend déjà de C, le flux principal passe par D.

2. Identification et calcul des chemins

Pour aller de A (Début) à J (Fin), il existe trois parcours principaux :

1. **Chemin "Front-end" : A → B → F → G → I → J**
 - Calcul : 3 + 5 + 6 + 4 + 5 + 2 = **25 jours**
2. **Chemin "Documentation" : A → B → H → I → J**
 - Calcul : 3 + 5 + 2 + 5 + 2 = **17 jours**
3. **Chemin "Back-end & Data" : A → C → D → E → G → I → J**
 - Calcul : 3 + 4 + 3 + 8 + 4 + 5 + 2 = **29 jours**

3. Analyse des résultats

Le Chemin Critique

Le chemin critique est la séquence la plus longue. C'est elle qui détermine la durée réelle du projet.

- **Chemin Critique : A → C → D → E → G → I → J**
- **Durée minimale du projet : 29 jours.**

Si n'importe laquelle de ces tâches prend 1 jour de retard, le projet entier passe à 30 jours.

Calcul des Marges (Total Float)

La marge est le temps de "repos" ou de retard possible pour un lot sans impacter la date de fin.

Lot	Fin au plus tôt (Date)	Doit finir au plus tard	Marge (jours)	Commentaire
B	Jour 8	Jour 12	4 jours	Limité par le chemin de F.
F	Jour 14	Jour 18	4 jours	Doit être prêt pour l'intégration (G) qui démarre au jour 18.
H	Jour 10	Jour 22	12 jours	Doit être prêt pour les tests (I) qui démarrent au jour 22.

Lots ayant de la marge :

- **Lot F (4 jours) :** Le front-end finit plus vite que le back-end. On peut attendre 4 jours de plus avant que cela ne bloque l'intégration (G).
- **Lot B (4 jours) :** Comme il précède F, il bénéficie de la même marge.
- **Lot H (12 jours) :** La documentation est la tâche la moins "sous pression". Elle peut être finie très tard sans bloquer les tests finaux.

4. Synthèse

Dans ce projet, l'effort principal se situe sur l'**Architecture, la Base de données et le Back-end**.

1. Définition des Lots (A à J)

- **Lot A : Conception & Modélisation.** Création du Modèle Conceptuel de Données (MCD) et définition des structures (salles, activités, intervenants).
 - **Lot B : Infrastructure & Sécurité.** Mise en place de l'hébergement, du nom de domaine et des protocoles de sécurité.
 - **Lot C : Développement Vitrine (Socle).** Création de la page d'accueil, du menu et de l'annuaire du réseau des MJC.
 - **Lot D : Développement Intranet (Socle).** Gestion de l'authentification et des annuaires d'équipes.
 - **Lot E : Conception du Fichier de Migration.** Création du fichier type d'uniformisation pour les 9 MJC.
 - **Lot F : Migration & Importation.** Intégration des données hétérogènes des MJC dans la nouvelle base.
 - **Lot G : Fonctionnalités Avancées.** Développement de l'Agenda, de l'espace Projets communs et de la liste de matériel.
 - **Lot H : Modules Optionnels.** Développement des modules Emploi/Bénévolat, Bons plans et optimisation SEO.
 - **Lot I : Recette & Documentation.** Tests de fiabilité, corrections de bugs et rédaction du guide utilisateur.
 - **Lot J : Formation & Livraison.** Formation des super-administrateurs et mise en service pour la rentrée.
-

2. Diagramme de Dépendances

Voici comment les lots s'enchaînent logiquement. Le **Lot A** est le point de départ indispensable car il définit la structure de tout l'outil.

graph LR

A[Lot A] --> B[Lot B]

A --> C[Lot C]

A --> D[Lot D]

A --> E[Lot E]

E --> F[Lot F]

B --> G[Lot G]

C --> G

D --> G


F --> G

G --> H[Lot H]

G --> I[Lot I]

H --> I

I --> J[Lot J]

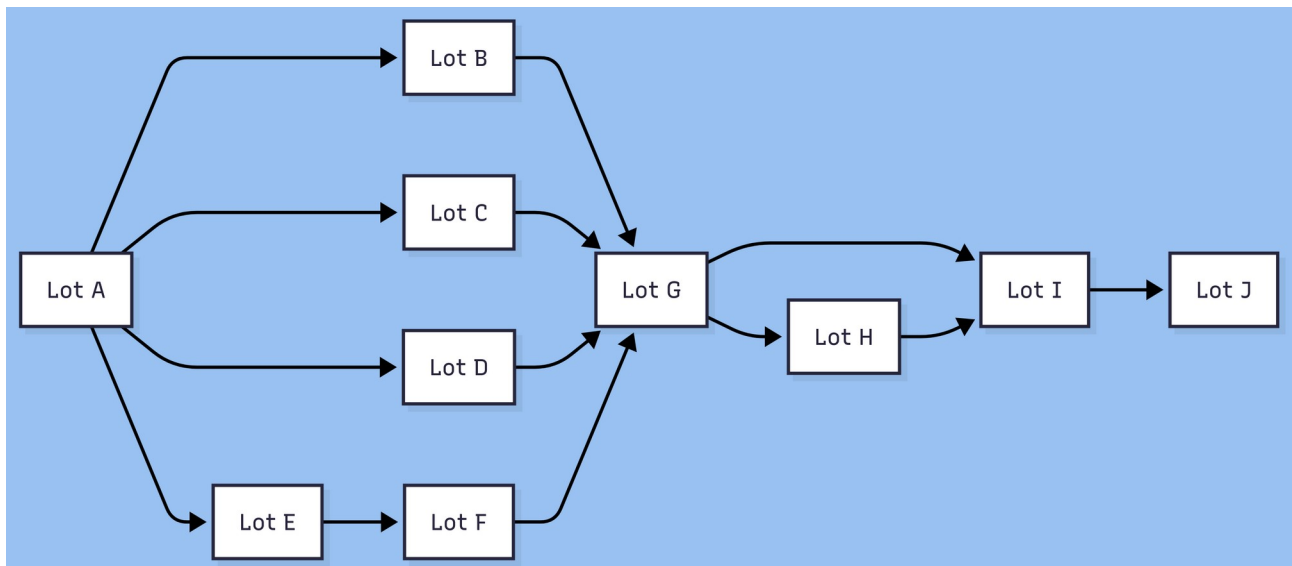

3. Identification des Chemins possibles (de A à J)

En gestion de projet, identifier ces chemins permet de voir quelles séquences de tâches peuvent être menées en parallèle ou lesquelles ralentissent l'ensemble (le chemin critique).

Les chemins directs (sans options) :

1. **Le chemin Infrastructure** : $A \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J$
2. **Le chemin Vitrine** : $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J$
3. **Le chemin Intranet** : $A \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J$
4. **Le chemin Données (Critique)** : $A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J$ (Sans les données, les modules avancés comme l'Agenda ne peuvent pas fonctionner).

Les chemins incluant les options (Lot H) :

5. **Optionnel Infrastructure** : $A \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$
6. **Optionnel Vitrine** : $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$
7. **Optionnel Intranet** : $A \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$
8. **Optionnel Données** : $A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$
